Dachsanierung Haus Nr. 12 – Bauablauf in Bild, Ton und Zahlen

Kennung: urn:uuid:3f2a9c51-7e14-4b8d-9a06-15c0d2e7b415

Stand (dateModified): 2026-10-12T11:00:00Z

Fassung: Hauptfassung (lebendig)

PDF-Ausgabe aus dem hpro-Container; die lebendige Fassung ist die Quelle. Erzeugt mit hpro-dienst 0.1.0.

Inhalt

Dachsanierung Haus Nr. 12 – Bauablauf in Bild, Ton und Zahlen ..... #titel S. 2
- Zeitraffer der Eindeckung ..... #zeitraffer S. 2
- Ablaufplan ..... #ablauf S. 2
- Warnsignal des Baukrans ..... #signal S. 3
- Aufwand je Gewerk ..... #aufwand S. 3
- Zur Darstellung ..... #hinweis S. 4

Dachsanierung Haus Nr. 12 – Bauablauf in Bild, Ton und Zahlen #titel

Dieser Bericht zeigt die Dachsanierung als lebendiges Dokument: ein Zeitraffer der Eindeckung, ein bewegter Ablaufplan, das Warnsignal des Baukrans und ein Diagramm, dessen Ansicht sich umschalten lässt. Jede bewegte oder interaktive Stelle hat eine statische Fassung mit denselben Angaben; ohne Skript und ohne Medienwiedergabe bleibt der Bericht vollständig.

Zeitraffer der Eindeckung #zeitraffer

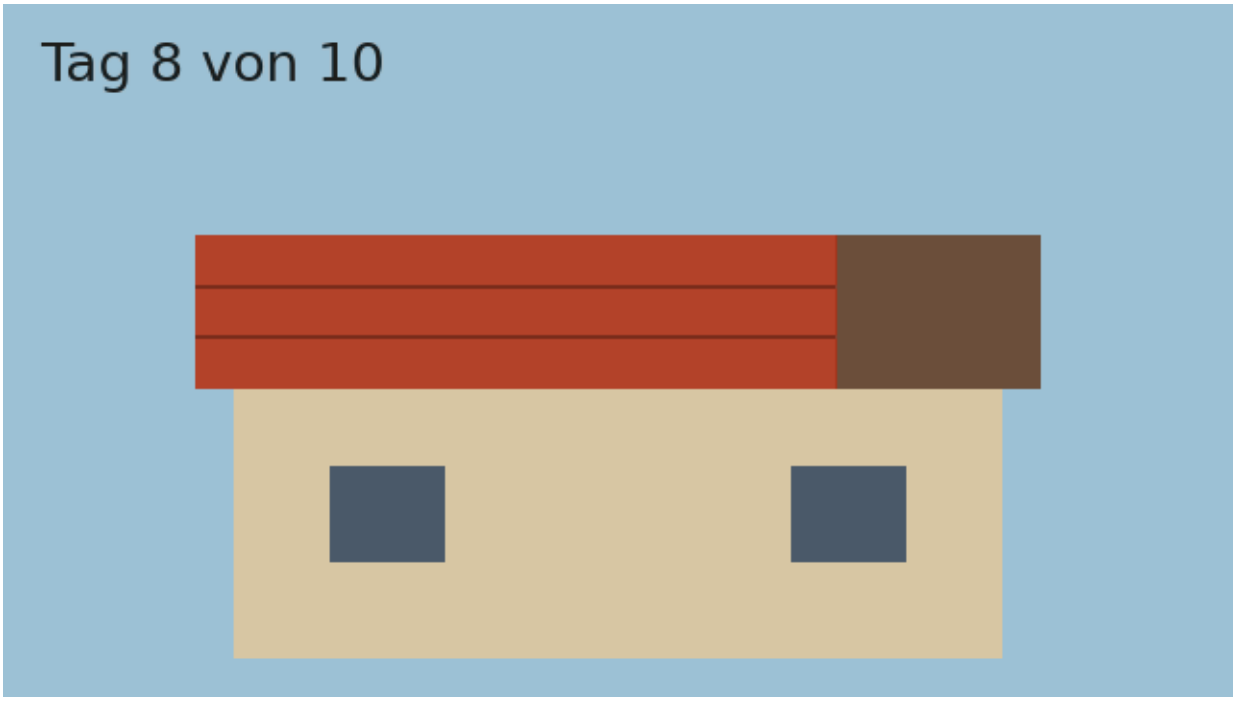

Zeitraffer, 8 Sekunden, ohne Ton: zehn Arbeitstage in 96 Bildern. Die neue Ziegeldeckung (rot) wächst von links nach rechts über die alte Dachfläche (braun); oben links zählt „Tag 1 von 10“ bis „Tag 10 von 10“ mit. Das Standbild zeigt Tag 8: drei Viertel der Fläche sind gedeckt.
Video, im Ausdruck als Standbild. Lebendige Fassung: content/index.xhtml#zeitraffer-video

Ablaufplan #ablauf

Die fünf Schritte folgen aufeinander; die Hervorhebung wandert im Takt von zwei Sekunden von Schritt zu Schritt. Bei reduzierter Bewegung steht der Plan still.



Reihenfolge: 1 Gerüst stellen, 2 alte Deckung abtragen, 3 Lattung und Unterdach, 4 Ziegel eindecken, 5 Spenglerarbeiten.
Animation, im Ausdruck als Standbild (Zustand bei reduzierter Bewegung). Lebendige Fassung: content/index.xhtml#ablauf-abbildung

Warnsignal des Baukrans #signal

Tonaufnahme – im Ausdruck nicht abspielbar.

Die Tonaufnahme lässt sich hier nicht abspielen; die Beschreibung steht darunter.

Tonaufnahme, 1,6 Sekunden: drei kurze, hohe Töne (880 Hz, je 0,3 Sekunden, dazwischen 0,25 Sekunden Pause). So warnt der Kran, bevor er eine Last über den Gehweg schwenkt. Der Ton spielt nur, wenn Sie ihn starten.
Tonaufnahme. Lebendige Fassung: content/index.xhtml#signal-ton

Aufwand je Gewerk #aufwand

Stunden und Kosten je Gewerk. Mit Skript lässt sich das Diagramm zwischen Stunden und Kosten umschalten und absteigend sortieren; die gewählte Ansicht wird im Dokument vermerkt. Ohne Skript zeigen Bild und Tabelle die Kosten.

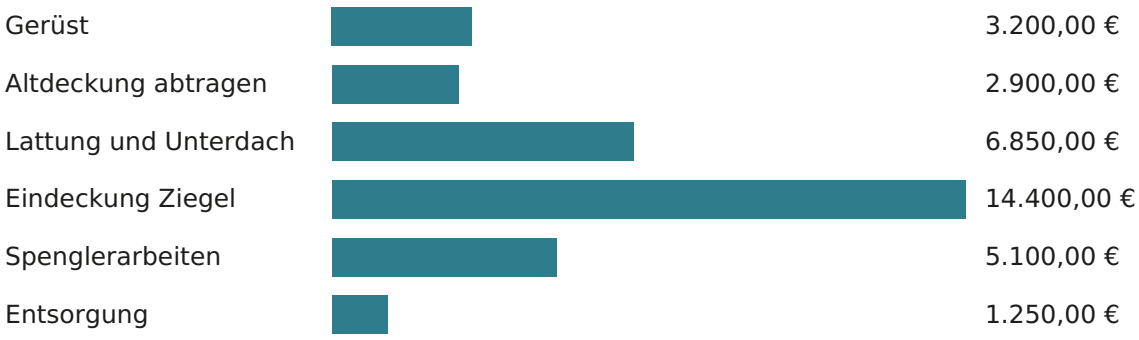

Kosten je Gewerk, Stand 12.10.2026 (statische Fassung).

Stunden und Kosten je Gewerk

Gewerk	Stunden	Kosten (€)
Gerüst	24	3.200,00 €
Altdeckung abtragen	40	2.900,00 €
Lattung und Unterdach	56	6.850,00 €
Eindeckung Ziegel	96	14.400,00 €
Spenglerarbeiten	32	5.100,00 €
Entsorgung	8	1.250,00 €
Summe	256	33.700,00 €

Interaktive Komponente hp-chart, im Ausdruck in der statischen Fassung. Lebendige Fassung: content/index.xhtml#aufwand-diagramm

Zur Darstellung #hinweis

Bewegte Inhalte halten an, wenn das System „Bewegung reduzieren“ meldet; dauerhaft laufende Bewegung lässt sich im Reader anhalten. Das Diagramm läuft als deklarierte Komponente in einer Sandbox ohne Netzzugriff und speichert nur im Dokument.
